

Cortex 通用專案管理平台

Universal Project Management Platform

讓接單更快 · 知識會累積 · 主管看得見

對齊 OIBG RFQ Flow · ★ 開案 Wizard · AI 加速 10 項 · Multi-PM · RACI · Stage Gate · Dependency-based deadlines

★ 開案 Wizard

7 步驟 · 30min → 5min

AI 加速 10 項

★ 狀態 SUMMARY 三處顯示

Multi-PM

DPM/BPM/MPM/EPM 各帶 team

RACI + Gate

A/R 雙角色 · 業務確認制

TL;DR

一句話懂 Cortex

集中平台 · AI 加速 · 知識累積 — 三件事



集中平台

資訊不散落

進度透明



AI 加速

開案 5 分鐘

狀態秒看清



知識累積

結案進 KB

全員學習

不是另起新系統,是 Cortex 加一個 menu 入口

PAIN POINTS

業務報價的 5 個痛點

這個平台一次解決這 5 件事



24h SLA 但資訊散落

Email / Webex / Excel / 個人電腦



歷史案沒沉澱

類似案來了還是要重跑一次



主管看不到整體進度

哪個專案卡住要一個個問



跨部門協作 15+ 角色

訊息散落不同 channel



Schedule 是 dependency

「QA+1day」Excel 算不準


→ 這個平台一次解決這 5 件事

★ 開案 Wizard 解 #1 + AI 加速 10 項解 #2/#3/#4 + Dependency Gantt 解 #5

ARCHITECTURE

系統架構鳥瞰

Cortex 主入口 → 通用 API 層 → 5 個底層服務

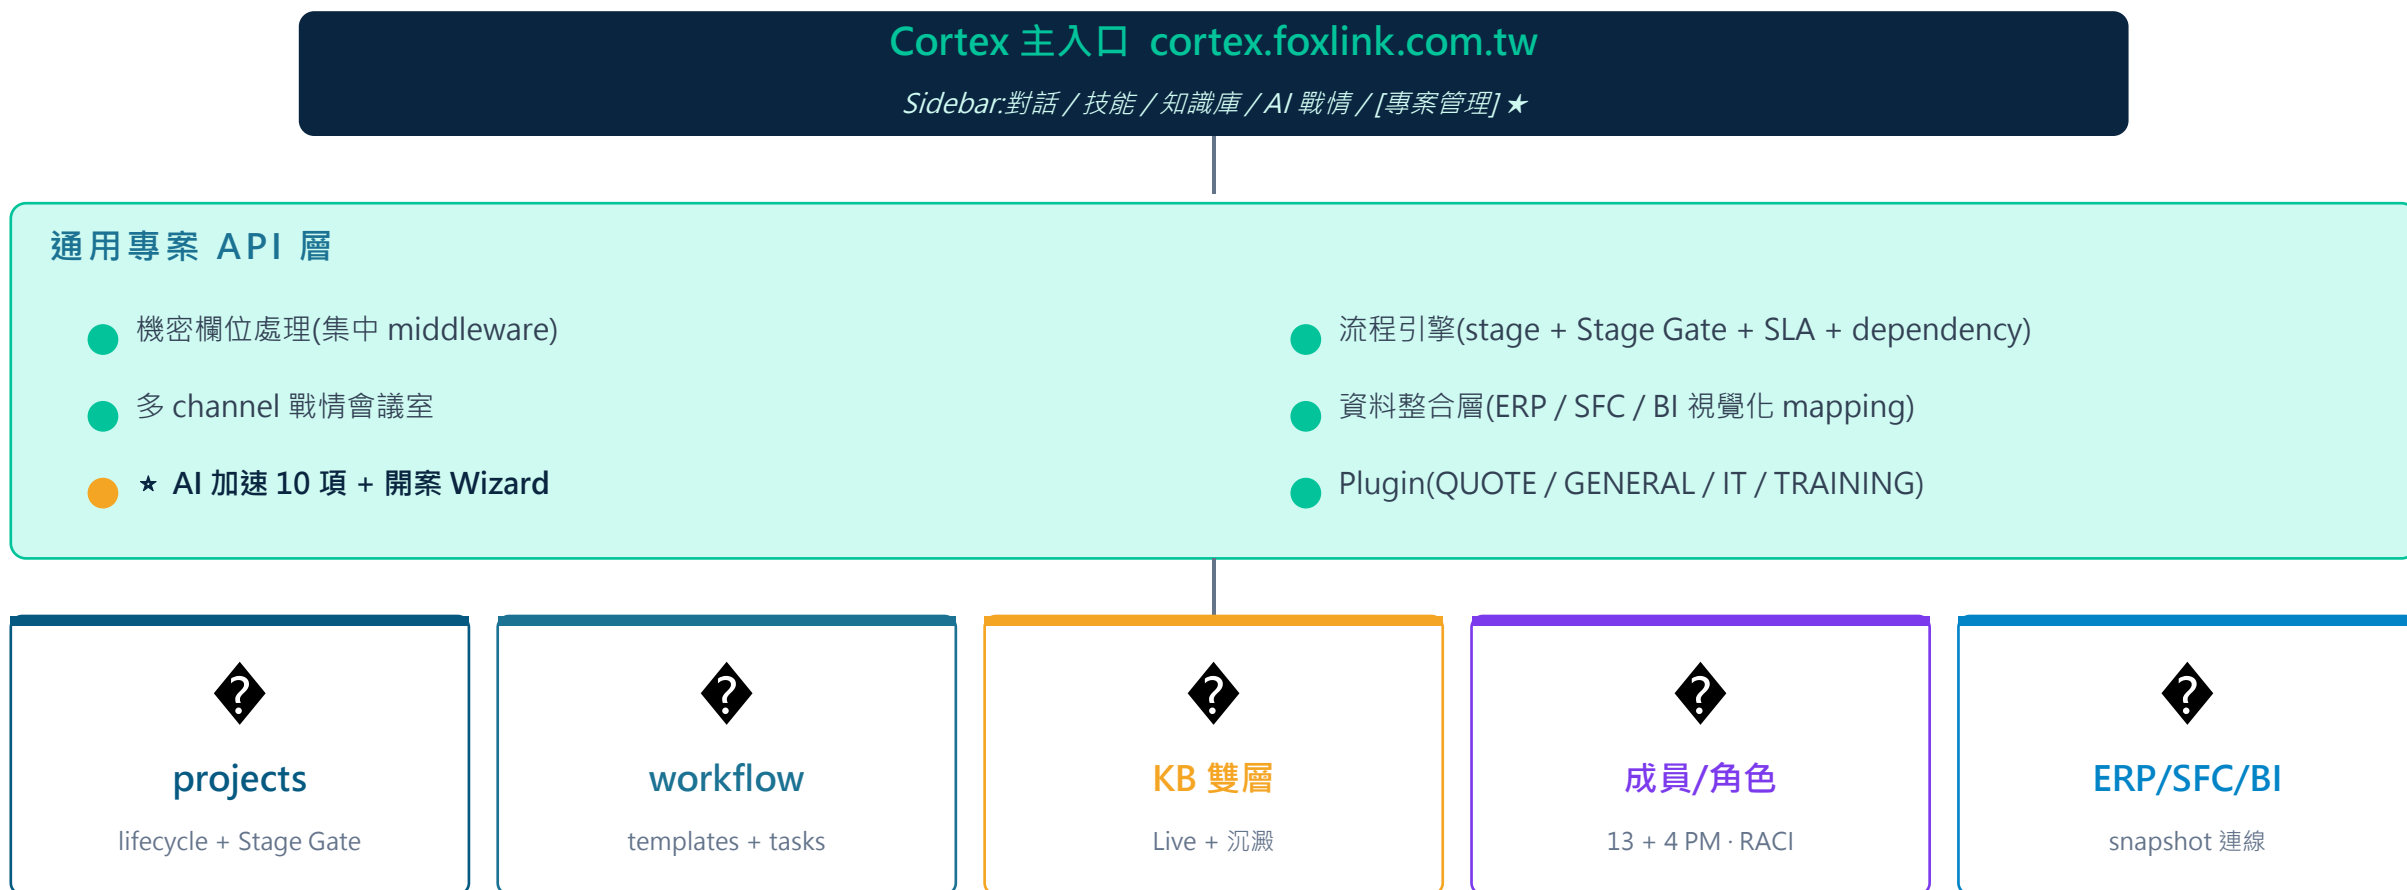

原則: 90% 通用層 + 10% Plugin 特化 · 機密處理集中, 不分散到各模組

☆ 開案 WIZARD · v3 NEW

7 步驟 Wizard · 30min → 5min

整合 AI #1 / #2 / #32 / #37 · 大量 AI 預填,業務只要 confirm



1 #1 RFQ 解析 客戶來信 拖 RFQ PDF · AI 解析填表	2 #2 / #32 / #37 歷史參考 AI 推薦 5 案 + PM	3 (rule) 機密設定 AI 預判機密欄位並預勾
4 (#2 延伸) PM/Team 業務指派 DPM 主 PM	5 (template) 流程模板 套 8-stage + AI 算 dependency	6 (rule) 重要緊急 priority_score 矩陣
7 — 確認啟動 一頁預覽 + 系統自動執行		

★ STEP 1 / 7

客戶來信 · RFQ 自動解析

★ 開案 Wizard · 7 步驟 AI 加速 · 30min → 5min

1 客戶來信 2 歷史參考 3 機密設定 4 PM/Team 5 流程模板 6 重要緊急 7 確認啟動

STEP 1 / 7

客戶來信 · RFQ 自動解析

Apple_USB-C_RFQ.pdf
✓ 已上傳 · AI 解析完成

AI 預填 · 業務 confirm 即可

客戶名	Apple Inc.	96%
料號	APL-USB-C-2-PRO	94%
數量	100,000	99%
交期	2026-08-15	91%

取消 下一步

AI 助手 · #1 RFQ 解析

已掃 PDF 7 頁，抓出客戶/料號/數量/交期/規格 5 項
整體信心度 92%

⚠ 規格不清(2 處)

- 電壓未填(5V / 9V?)
- RoHS 是否要求未提

→ 系統將列入 Step 2 Q&A 澄清

解析時間 0.8 秒 · Gemini Flash · 業務原本要花 30 分鐘讀完 PDF 手填

說明


業務拖 PDF 進系統(左下角拖檔區)· AI 0.8 秒解析,自動填客戶/料號/數量/交期 · 右側 AI 助手 panel 顯示 #1 RFQ 解析 + 信心度 92%、抓出 5 個規格不清(電壓 / RoHS)· 業務 confirm 即可

◆ 重點

原業務需 30 分鐘讀 PDF 抓欄位 + 寫表單 → AI 0.8 秒抓 + 預填 70%,業務只看 + confirm

★ STEP 2 / 7

歷史參考 · 推薦 PM + 交期合理性

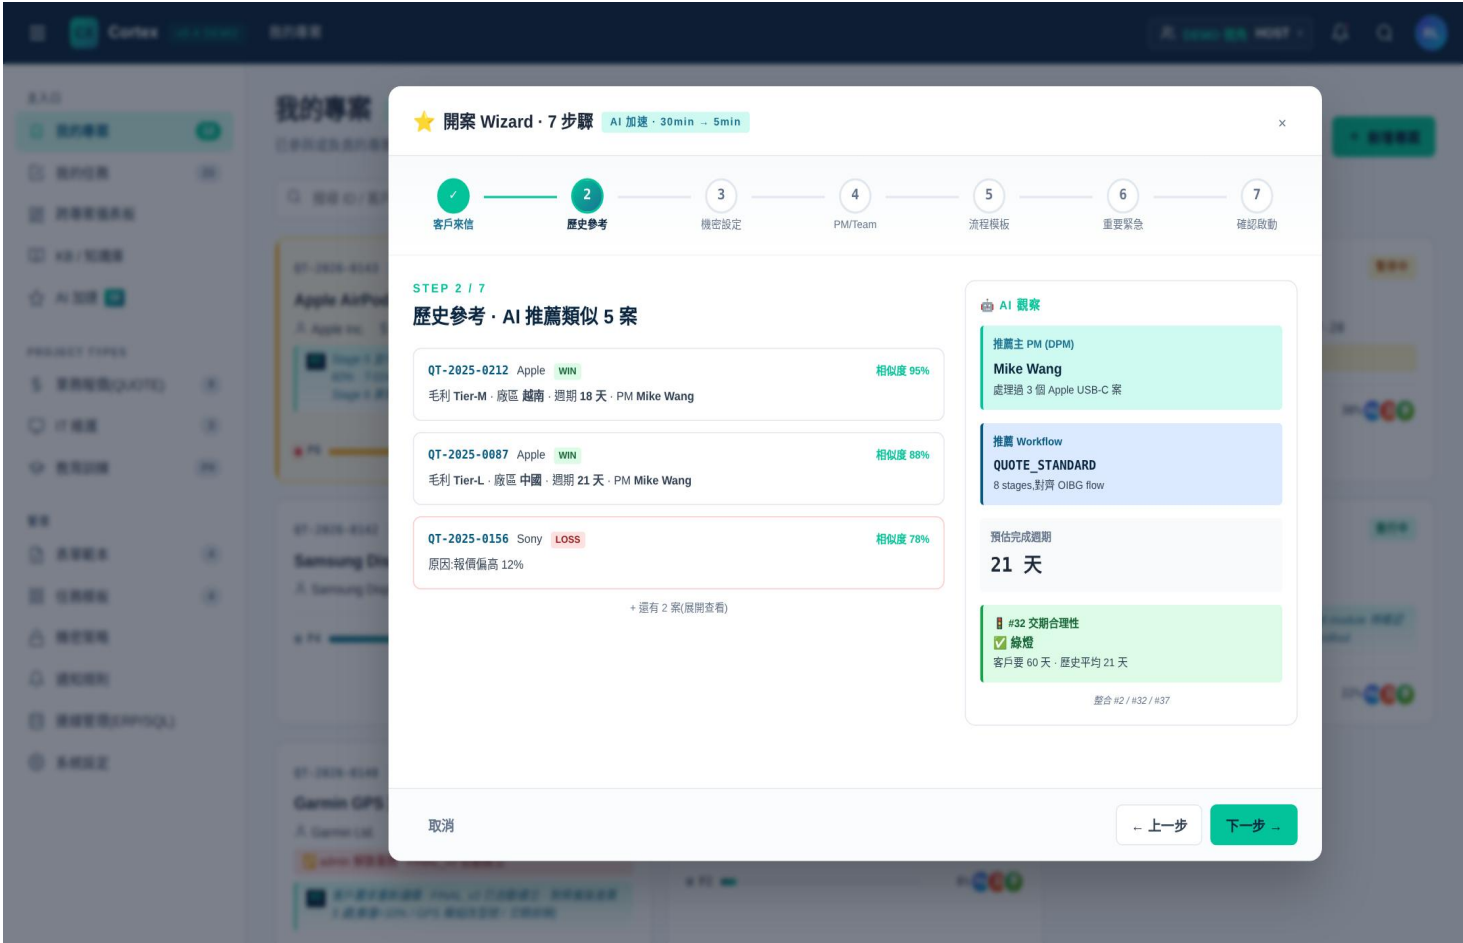

說明

AI 推薦 5 個相似案(Apple USB-C 同類)· 顯示歷史結果 (WIN/LOSS)· 毛利 / 廠區 / 週期 / 主 PM · 右側 AI 觀察 panel 推薦主 PM(Mike Wang 處理過 3 個 Apple USB-C)+ 預估 21 天 + 交期合理性綠燈

重點

整合 #2 歷史相似 + #32 交期合理性 + #37 主動推薦 — 開案立刻知道「有沒有歷史可參考、誰最適合接、多久會做完、客戶要的時間做不做得到」

★ STEP 7 / 7

確認 + 啟動 · 系統自動建一切



說明


一頁預覽全設定:客戶/料號/PM 三劍客/Workflow/機密旗標 · 點啟動後系統自動執行 5 件事(建 7 channels / 8 stages 任務 / 通知 / Pin 啟動公告 / 啟動 SLA 倒數)

◆ 重點

業務 confirm 後 0 動作 — 系統包辦所有 setup;從拖 RFQ 到此 step 共 5 分鐘(原本 30 分鐘)

WAR ROOM · MULTI-CHANNEL

戰情會議室 · Slack-like 三欄 + AI 整合

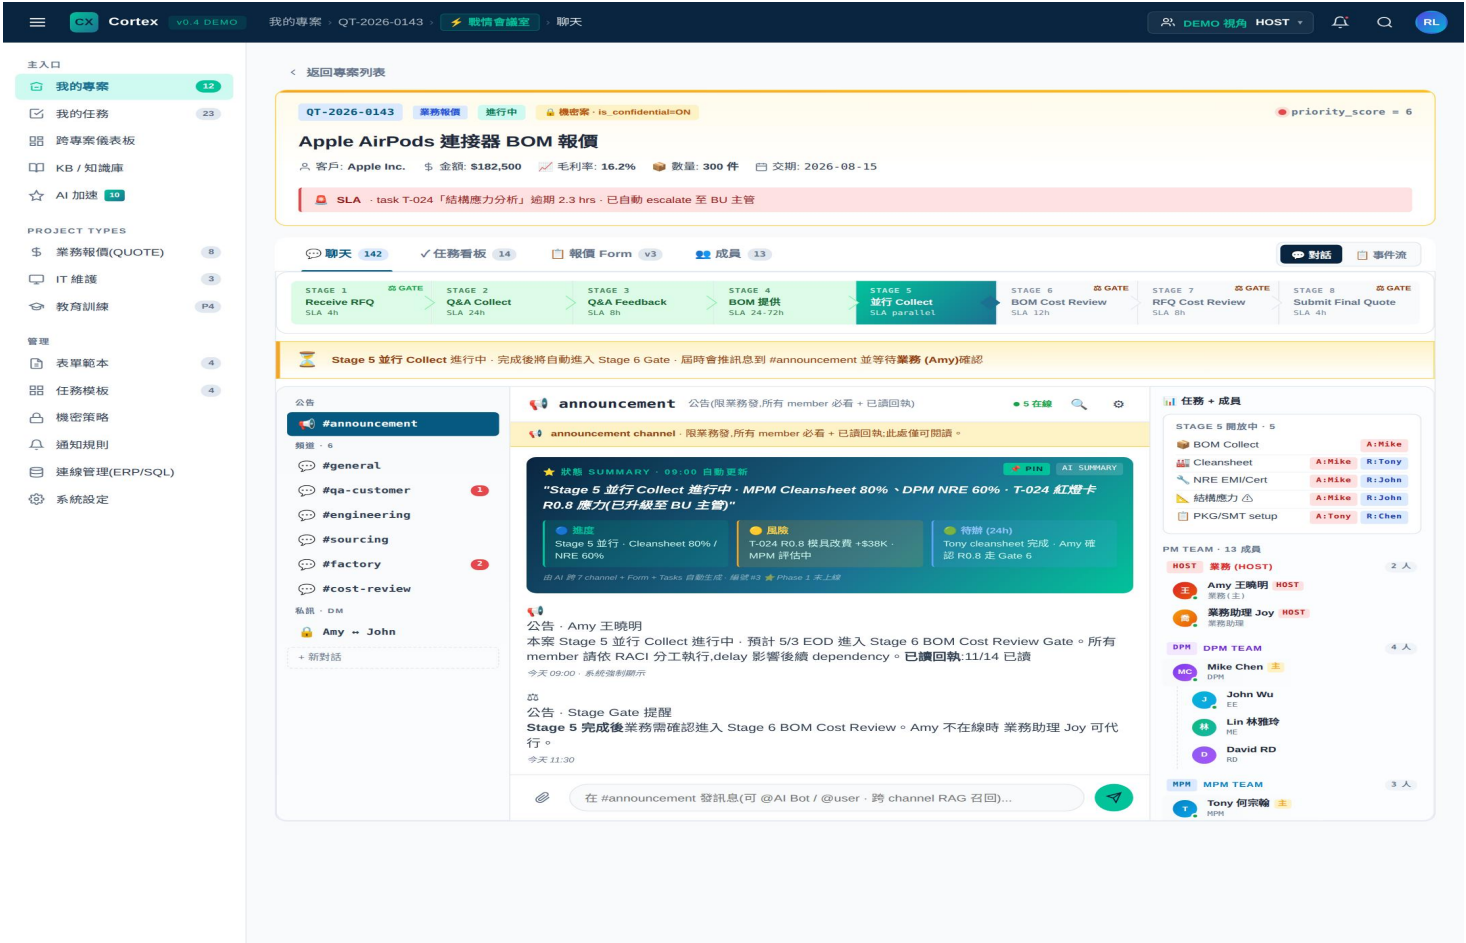

說明


頂部 8-stage Ribbon · 中間 3 欄(channel sidebar / 訊息流 / 任務+成員)· #announcement 頂部 Pin ★ AI 狀態 SUMMARY(漸層大卡 · 三段式 進度/風險/待辦)· 右欄成員依 PM Team 分組

重點

整合 AI #21 狀態 SUMMARY (核心) + #23 自動寫決策紀錄 + #24 訊息智慧排序; ★ Pin 是 #21 狀態 SUMMARY 三處顯示之一

IN-CHANNEL AI

Channel 內 AI · Q&A 草稿 + Bot 主動提醒

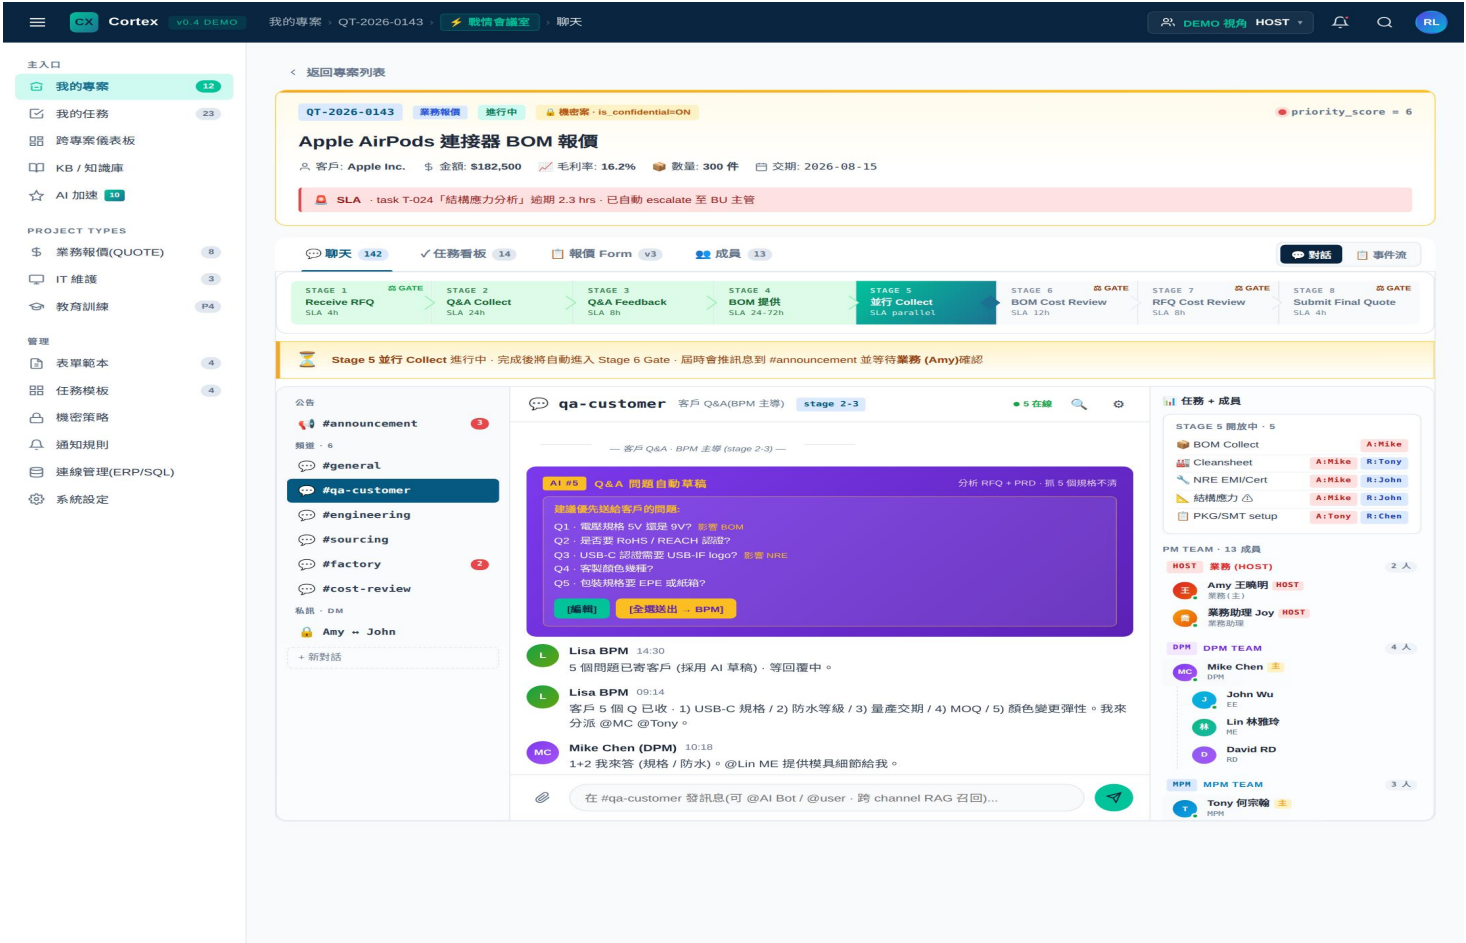

說明

#qa-customer 進入後 AI 自動產 5 個問題草稿(分析 RFQ + PRD 抓規格不清)· Q1 影響 BOM、Q3 影響 NRE 標註· 業務點 [全選送出 → BPM] 即送客戶· 不用 DPM 自己想要問什麼

重點

AI #5 Q&A 草稿:DPM 從零想 30 分鐘 → AI 列好 5 分鐘編輯;AI #26 Bot 主動提醒:SLA 接近 + 上下文判斷,@對應 owner

FORM · RACI + AI

Form 填寫 · RACI A/R + 每欄位 AI 建議

主入口

我的專案15

我的任務23

跨專案儀表板

KB / 知識庫

AI 加速10

PROJECT TYPES

業務報價(QUOTE)8

IT 維護3

教育訓練14

管理

表單範本4

任務模板4

機密策略

通知規則

連線管理(ERP/SQL)

系統設定

返回專案列表

QT-2026-0143 單務報價 進行中 機密策略 is_confidential=ON priority_score = 6

Apple AirPods 連接器 BOM 報價

客戶: Apple Inc. 金額: \$182,500 毛利率: 16.2% 數量: 300 件 交期: 2026-08-15

SLA - task T-024「結構應力分析」逾期 2.3 hrs - 已自動 escalate 至 BU 主管

聊天 142 任務看板 14 報價 Form v3 成員 13 lifecycle: ACTIVE

v1 初版 4/15

v2 客戶議價 #1 4/22

v3 客戶議價 #2 ★ 5/01

v4 draft 中 填寫中

FINAL 最終確認

V3 - V4 草稿進度 34/ 56 61% 已連線, 可編輯

客戶資料 8/8 - 100%

BOM 結構 12/12 - 100%

詢價彙總 6/8 - 75%

成本核算 6/10 - 60%

議價策略 2/10 - 20%

法務 review 0/6 - 0%

詢價彙總 6 / 8 欄位完成 - 廠商報價、前置時間、詢價附件 從 KB 匯入詢價樣板 比較 v2

最低報價 \$172.5 /件 - 估承前密

最高報價 \$298.0 /件 - 立統前密

中位 / 平均 \$188.3 /件 - 自動計算

BOM 主料號 CN-2026-A1B2 AUTO

詢價廠商數 5 家 已存

詢價廠商與報價

廠商	單價	交期週	狀態	來源 / 備註
協通轉運	4172.5	4 週	已存	業務電話 4/24

說明


左欄版本鏈 v1→v2(客戶議價#1)→v3(議價#2 ★)→v4 draft → FINAL · 右側填寫表 · 機密欄位有 鎖頭 · AI 建議按鈕在每欄位旁(類似案推薦 + accept)

重點

每張 form 欄位有 R(實作)/ A(背鍋)雙角色標記 · AI 建議 < 2s,基於歷史相似案 / ERP 拉值;業務按 [accept] 即填入

TASKS · GANTT

任務看板 + Dependency Gantt

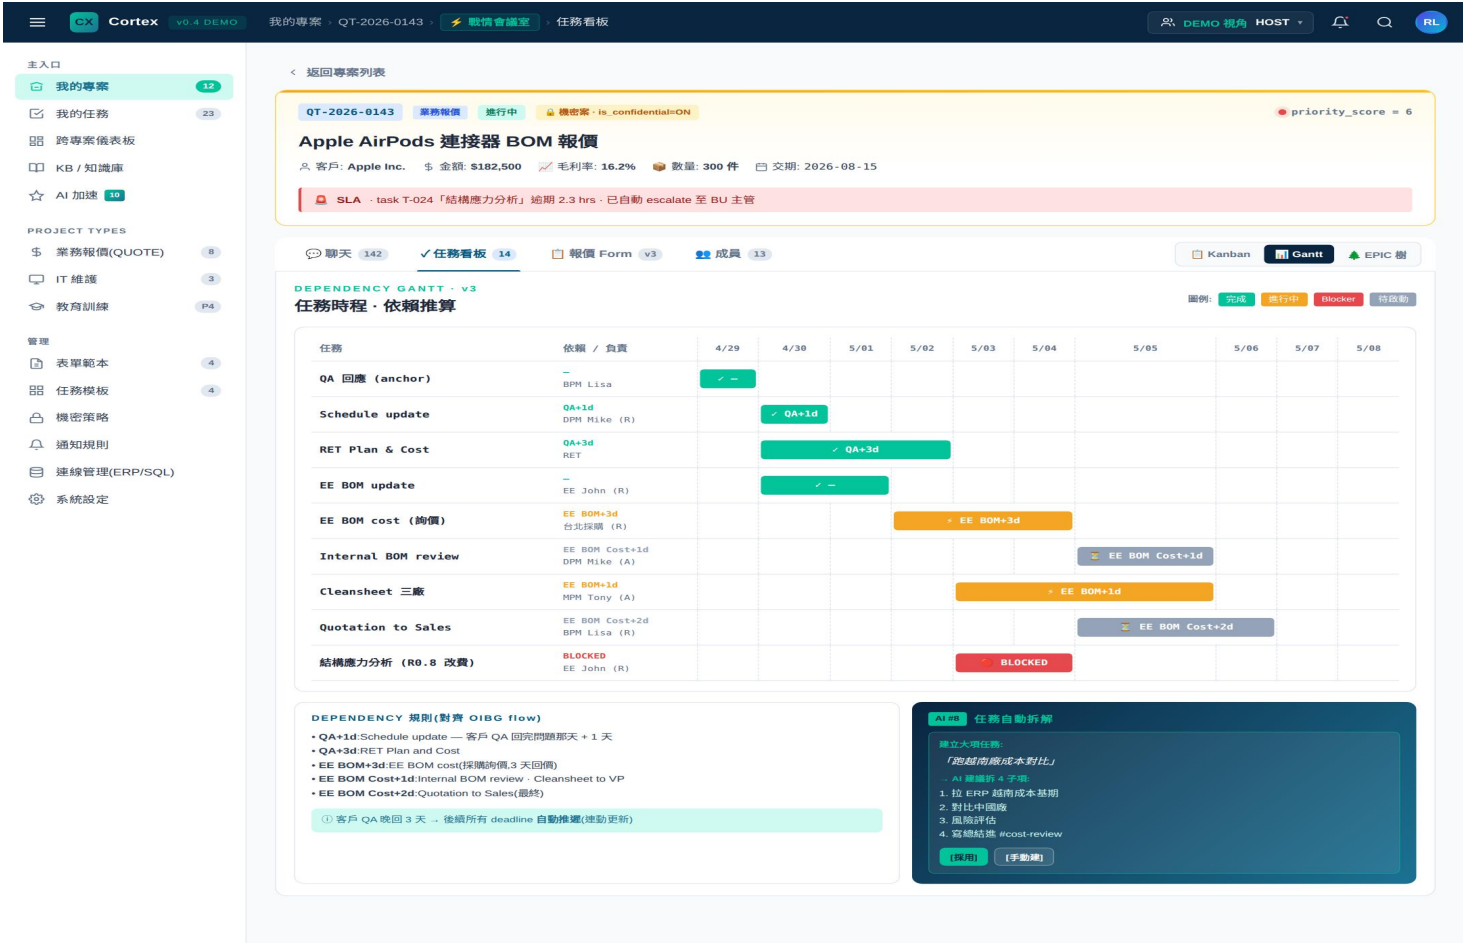

說明

頂部 [Kanban / Gantt / EPIC 樹] toggle · Gantt 視圖顯示 dependency-based 排程(QA+1d / EE BOM+3d / EE BOM Cost+1d) · 客戶晚回 3 天 → 後續自動推遲 · 右下 AI #29 任務拆解 panel(一句話「跑越南成本」→ 4 子項)

重點

Dependency-based Deadline 是 OIBG flow 核心特色 · 對應 Schedule example 寫的「Schedule update (DPM, QA response+1day)」 — 系統自動算 + 連動更新

CROSS-PROJECT DASHBOARD

跨專案儀表板 · 列表帶 ☆ Status SUMMARY



說明

進系統第一眼:8 張專案卡 · 5 種 lifecycle 狀態 (ACTIVE/DRAFT/PAUSED/CLOSED/REOPENED) · 機密案琥珀邊條 · 每張活躍卡帶一行 ☆ AI 狀態 SUMMARY(cache 30 min) · 主管不點進專案就知進度

重點

AI #21 狀態 SUMMARY 三處顯示之一(此處是「專案列表行下」) · 其他兩處:#announcement Pin / Watchlist hover

★ CORE FEATURE · #21

Status SUMMARY · 三處顯示

AI 自動產出 + 三處同步顯示 · 主管 30 秒看完所有專案

1. #announcement Pinned

每天 09:00 自動 / Stage 切換 / @bot summary

"等客戶 Q&A 回覆,後段 BOM 提供已 ready"

進度: Stage 3, BOM 預先做

風險: 客戶 5 天沒回, SLA 80%

待辦: BPM 主動 follow up

2. 專案列表行下

每行專案下方一行灰字摘要 (cache 30 min)

QT-2026-0143 / Apple

等客戶 Q&A 5 天,後段 BOM 已 ready

QT-2026-0145 / Sony

核算階段 80%,只剩工時待填

3. 主管 Watchlist Hover

priority_score≥6 自動訂閱

hover QT-2026-0143:

→ tooltip 完整摘要

"等客戶 Q&A 回覆..."

進度 / 風險 / 待辦

觸發時機

每天 09:00 自動產出

Stage 切換時自動更新

任意 channel 手動 @bot summary


業務最有感的 AI 功能

主管 30 秒掃完所有專案 · 業務不用爬 channel 翻訊息 · 7 channel + form + tasks 全部 AI 跨來源摘要

CONCEPT

Multi-PM + RACI + PM Team

業務(主+助理) HOST · 4 種 PM 各帶自己 team

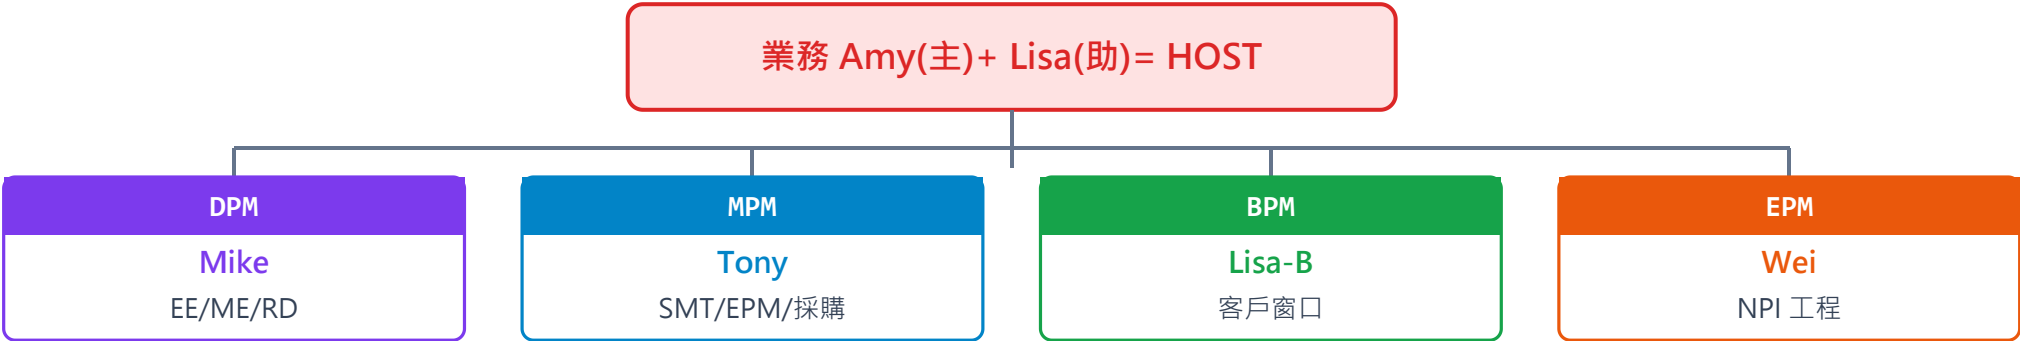

RACI 範例(對齊 OIBG flow)

項目	A · 背鍋	R · 實作
BOM cost - EE	DPM	台北採購 / 工廠採購
BOM cost - PKG	MPM	工廠採購
Cleansheet	DPM	SMT team / NPI EPM
NRE - ME Tooling	DPM	廠商 / 塑件 PM

CONCEPT

Stage Gate · 業務確認制

stage 不自動跳 · 全 task 完成 → 業務點「進入下一 stage」



業務點
「進入
下一
stage」

#announcement channel 範例

💡 [系統訊息] Stage 4(BOM 提供)全部 task 完成

- ✓ EE BOM 完成 by Lin(EE)
- ✓ ME BOM 完成 by Wang(ME)
- ✓ Tooling cost 完成 by PE

請業務或業務助理確認進入 Stage 5(並行 Collect)

✓ 進入 Stage 5(並行)

限業務 Amy / 助理 Lisa 點擊

🌳 Stage 6 / 7 / 8 都走 gate 確認

對齊 OIBG flow 「集合會議」概念 — 業務開會確認可以進下一步;業務不在線時業務助理可代行

CONFIDENTIALITY

機密保護 · 欄位級 + 4 種顯示策略

建立時勾欄位 · 邀請成員時個別授權 · 不同人看到不同畫面

建立專案時：

☒ 標記為機密專案

↓ 勾選哪些欄位機密：

☒ 報價金額 (amount)

策略：TIER

☒ 毛利率 (margin)

策略：TIER

☒ 成本明細 (cost_breakdown)

策略：TIER

☐ 客戶名稱 (customer_name)

策略：ALIAS

☐ 數量 (quantity)

策略：RANGE

不同人看到不同畫面

業務 Amy: 報價：\$ 2.143 / pcs 毛利：16.6%

PM Mike: 報價：\$ 2.143 / pcs 毛利：16.6%

EE John (已授權): 報價：\$ 2.143 / pcs 毛利：16.6%

EE Lin (未授權): 報價：Tier-A 毛利：Tier-M(中)

Observer: 客戶：A001 · 數量：100~500

← 走 ALIAS / RANGE / TIER / MASK 4 種策略

4 種顯示策略

TIER

分級(Tier-A)

ALIAS

代號(A001)

MASK

打星(蘋果****)


RANGE

區間(100~500)

KNOWLEDGE PIPELINE

知識沉澱:Live KB + 沉澱 KB(雙層)+ ERP 整合

進行中 Live KB 即時可查 · 結案 AI 摘要 + 脫敏 → 沉澱 KB

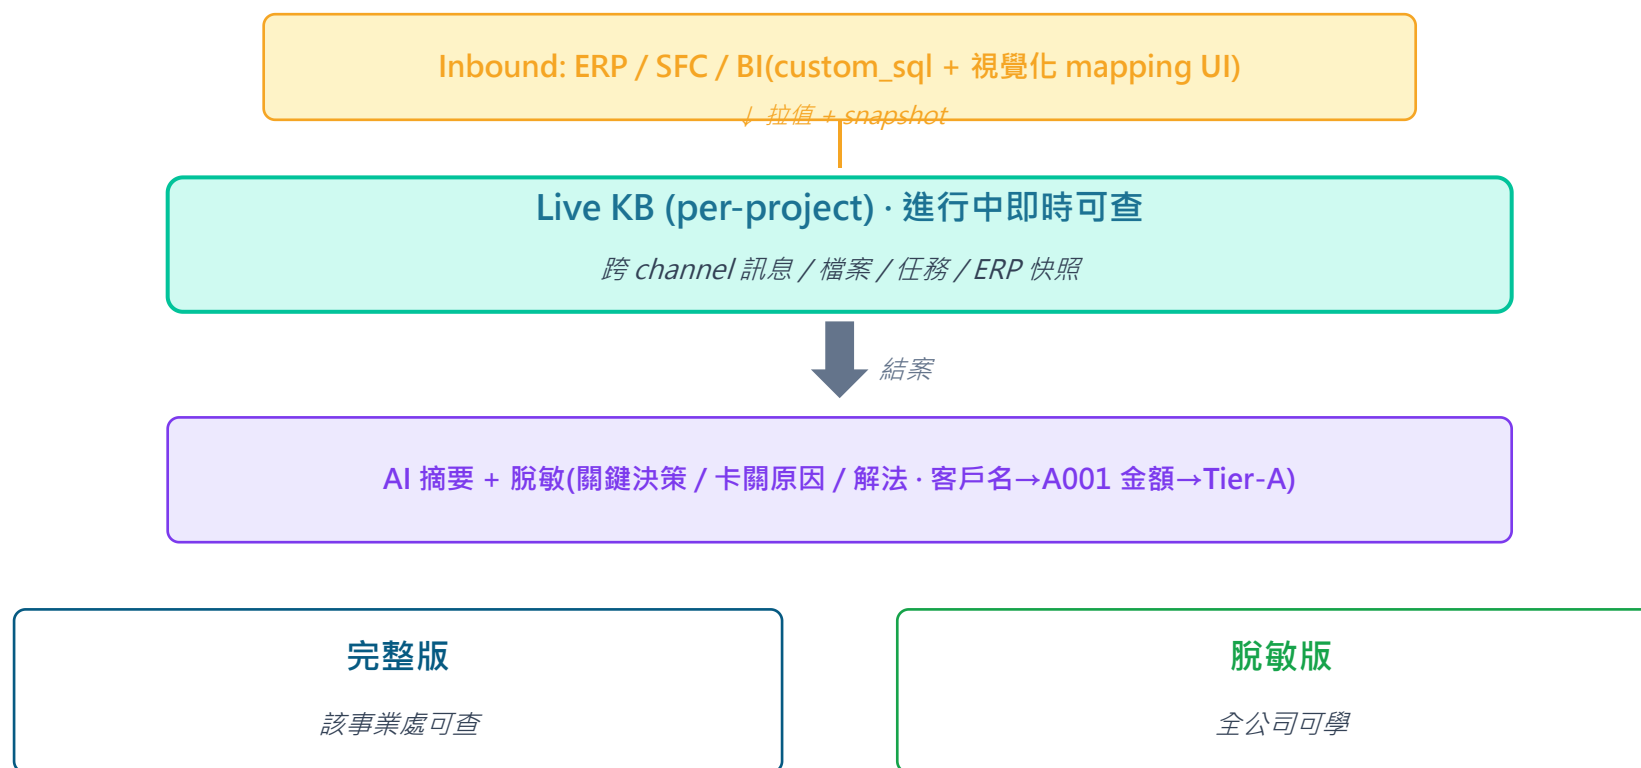

❖ 範例 RAG 查詢

❖ 「USB-C 給車用客戶過去策略？」 → ❖ 找到 3 案 → 2 Win / 1 Loss, 平均毛利 Tier-M

ROLES

13 角色身份(全 admin 手動授,一人多身份)

專案身份 6 + 系統 / workflow 身份 7 = 13 種

專案身份(6)

project.sales

業務(發起人 + Stage Gate)

project.bu_director

BU 主管(處級,multi-BU 授權)

project.top_director

最高層主管(全公司)

project.bu_super

BU 經管(主動 self-join)

project.hq_super

HQ 經管(主動 self-join 全公司)

project.pm

PM(sub_role: DPM/BPM/MPM/EPM)

系統 / workflow 身份(7)

workflow.admin

編 SYSTEM 流程模板

workflow.bu_editor

編 BU 流程模板

data.connection_manager

管 ERP / SFC 連線

notification.editor

編通知規則

confidential.policy_editor

編機密策略

admin

系統管理員

admin.testing

測試模式 toggle

❖ 原則

全 admin 手動授;一人多身份(union 權限);一般專案參與者不需預授(可跨組織邀)

INTEGRATION

整合 Cortex 既有模組(混合策略)

重做 / 保留 / 共用 / 抽出 — 4 種處理方式

Cortex 既有模組	處理方式
戰情會議室 / 任務看板 / Form 引擎	✔ 重做(專案脈絡耦合強)
AI 戰情(BI)	⚠ 保留 + 可嵌入專案頁
知識庫市集	✔ 共用,新增 projects-* 命名
技能 / ERP / MCP / 文件範本	✔ 完全共用
聊天底層	✔ Phase 2 抽出 = 域內通訊
教育訓練	⚠ 完全獨立(P4 看雙向)

💡 機密處理集中

機密處理集中在平台層 confidentialityMiddleware · 各模組統一消費,不分散邏輯 · 因此無論哪個模組存取機密欄位,都走同一份策略表

AI 加速 10 項 + ☆ 開案 Wizard

Phase 1 未上線 · Gemini Flash 預估 USD \$150-250 / 月

☆ 開案 7 步驟 Wizard

整合 #1 RFQ 解析 + #2 歷史相似 + #32 交期合理 + #37 主動推薦
業務拖 RFQ → AI 自動填 → 推薦 PM → 7 步驟到啟動

30 分鐘 → 5 分鐘

#21 ☆ 狀態 SUMMARY 三處顯示(核心)	#1 RFQ 自動解析 拖檔填表 70%	#2 歷史相似案推薦 + 推薦 PM	#5 Q&A 問題草稿 AI 列 5-10 問題	#23 AI 決策紀錄 自動 Pin
#24 訊息智慧排序 @我/Decision/Blocker	#26 Bot 主動提醒 SLA 接近自動催	#29 任務自動拆解 PM 一句話 → N 子項	#32 加分 交期合理性 最早 / 推薦 deadline	#37 加分 歷史案主動推薦 機會偵測 surface


v3 移除 12→10: ✕ #10 長料件預警(試產轉量產才需要) ✕ #14 三廠對比 AI 解讀(廠區客戶指定,移到未來)

走 Gemini Flash 預估 USD \$150-250 / 月 · Phase 2 / 3 已規劃 13 項深化(Cleansheet / 智慧定價 / ML 預測)

CUSTOMER INTEGRATION

對外系統交付:不直接對客戶

透過下游「客戶報價系統」· Phase 1-3 純人工傳 Excel

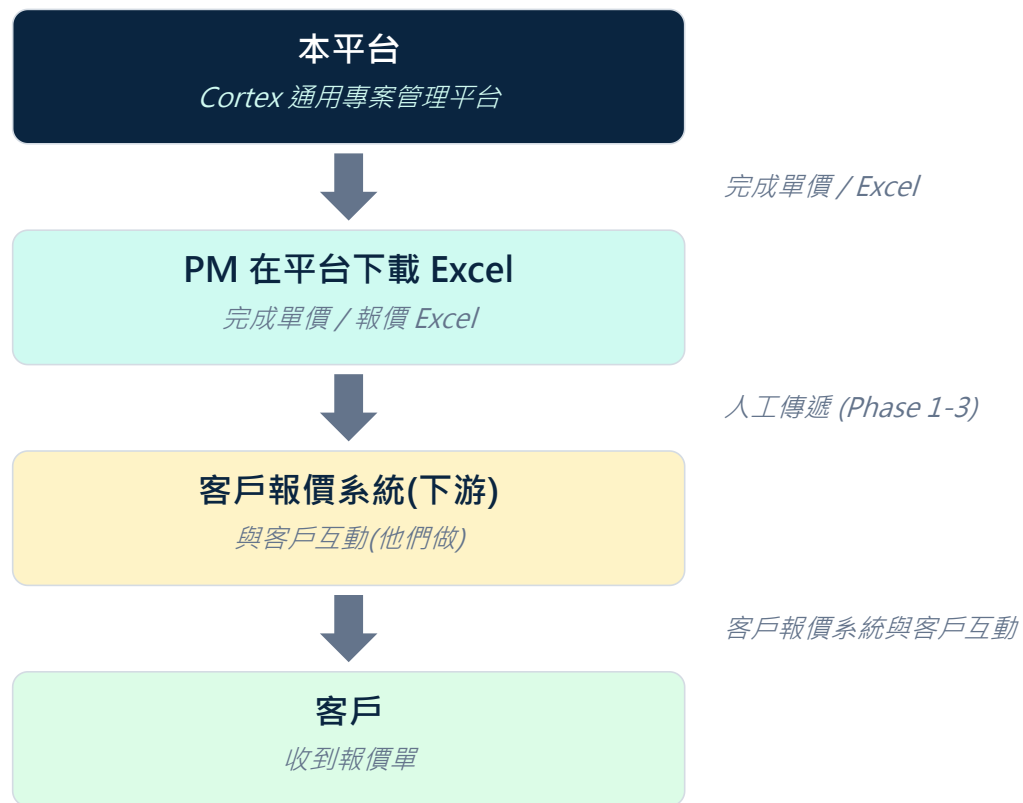**Phase 1-3:**

純人工傳遞 Excel (PM 下載後手動傳)

Future:

雙向 API 串接(待客戶報價系統提供 API) · ✕ 不做: Email gateway / 客戶 portal / 電子簽

SECURITY LAYERS

安全分層 · 4 層防護

身份驗證 / ACL / 加密 / 浮水印 + 稽核

01

身份驗證

SSO 登入

離職自動撤權

02

權限控管 ACL

沒被邀請完全看不到

金額欄位個別授權

03

資料加密

機密欄位 AES-256(連 DBA 看不到明文)

Oracle TDE 表空間

04

浮水印 + 稽核

匯出檔案自動蓋浮水印

操作紀錄永久保留

沒做:獨立網址 / 強制 2FA(內部使用,合規不要求物理隔離)

PHASING

上線時程 · 4 Phase

Phase 1 ~6 週(2-4 + AI 加速 1.5-2) · Phase 2 4-8 週 · Phase 3 8-12 週 · Phase 4 持續

Phase 1

~6 週(2-4 + AI 1.5-2)

通用 schema + project_types · Form 引擎 GUI Builder · 大項/小項 task + RACI + Multi-PM + Stage Gate · Dependency-based deadlines · 多 channel 戰情會議室(含 DM) · 跨專案儀表板 · Inbound 資料整合層 · ★ 開案 7 步驟 Wizard + AI 加速 10 項

Phase 2

4-8 週

super_user / Bot 整合 · 結案 fork + KB sediment · 域內通訊(跨專案 channel) · AI 戰情 embed · AI 13 項深化(智慧定價 / Cleansheet / 主管日報)

Phase 3

8-12 週

What-if / 贏單預測 / 多級簽核 · ML 預測警示

Phase 4

持續

TRAINING / IT plugin · 客戶報價系統 API 對接 · 長料件預警(試產轉量產) · 三廠成本對比 AI 解讀

EXPECTED IMPACT

預期效益・量化

業務效率 / 主管效率 / 知識資產 — 三類

業務效率

開案時間

30 分鐘 → 5 分鐘

(Wizard)

RFQ 解析

30 分鐘 → 5 分鐘

(#1 AI)

Q&A 整理

人想 30 分鐘 → 5 分鐘

(#5 AI)

任務拆解

30 分鐘 → 5 分鐘

(#29 AI)

24h SLA 達標率

?% → 90%+

主管效率

專案狀態檢視

不爬 channel → 30 秒看完

(SUMMARY)

跨案進度掌握

一個個問 → 燈號儀表板

異常專案發現

事後知道 → Bot 主動提醒

知識資產

知識保留率

靠個人 Excel → 100% 結案沉澱

新人 ramp-up

? 個月 → 縮短 50%

跨組找回訊息

翻 chat → 多 channel 直接找

RISKS & MITIGATIONS

風險與緩解

風 險	緩 解
通用化稀釋報價特色	UI 顯著差異化(QUOTE 主題色 + 戰情會議室 + SLA banner)
主入口失去 hostname 隔離	ACL + 加密 + 稽核補
訊息永久保留 → storage	Hybrid Partition + Compress Archive
多 channel 一開始上手曲線	QUOTE 預設 7 channels 已建好,業務不用自建
Multi-PM + RACI 概念複雜	對齊 OIBG 既有邏輯,業務本來就用這邏輯只是沒系統支援
Stage Gate 阻塞流程?	業務 + 助理一定有人在線 · admin testing 可繞
AI 過早 ML 過擬合	拆 3 層,P3 才上 ML
AI Wizard 預填錯	業務 confirm 機制 + audit log

KICKOFF CHECKLIST

Phase 1 啟動 Checklist · 主管要協助

❖ 開工前必補(主管授權)

- ☐ admin / top_director / bu_director 名單
- ☐ 業務部 / PM 部 LDAP group
- ☐ 組織層級(BG / BU / sub-BU)結構
- ☐ Tier 邊界確認(金額 USD / 毛利率)
- ☐ Pilot 候選 RFQ 案 1-2 個 + PM 陪跑
- ☐ DPM/BPM/MPM/EPM 名單(對應 Multi-PM)
- ☐ QUOTE form 16 項 deliverable RACI 表

🌀開發中補(業務 / 財務)

- ☐ QUOTE form 完整欄位清單
- ☐ Tier USD 邊界(財務確認)
- ☐ Notification 規則初始
- ☐ Dependency Schedule 範本

時程: W0 收 checklist → W1-3 收資料 → W4 Kickoff → W6 內部測試 → W9-12 Pilot → W13 正式發布

EXEC DECISIONS

待主管決議的事項

- ☐ 1. 通用平台方向(取代 v0.3.5 報價特化)
→ 一個底層服務多種專案類型
- ☐ 2. 整合到 Cortex 主入口
→ 放棄獨立 hostname / 2FA
- ☐ 3. 全平台訊息 / 檔案 / KB 永久保留
→ Storage 成本以 Hybrid Partition 控制
- ☐ 4. 對外不直接面向客戶
→ 透過客戶報價系統 · Phase 1-3 人工傳 Excel
- ☐ 5. Phase 1 上線時程 ~6 週
→ 開工前 1-2 週主管協助提供資料
- ☐ 6. ★ 對齊 OIBG RFQ flow
→ Multi-PM + RACI + Stage Gate + Dependency
- ☐ 7. ★ AI 加速 10 項 + 開案 Wizard 必上
→ 業務開案 30min → 5min · 狀態檢視不爬 channel

感謝聆聽

Questions & Discussion

★ 開案 Wizard 30min → 5min · AI 加速 10 項 · 狀態 SUMMARY 三處顯示

- docs/projects-platform-spec.md
- docs/oibg-rfq-flow-explained.md
- docs/projects-platform-slides.md
- docs/projects-platform-launch-checklist.md
